

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 17/07/2025 Inspecteur: Jean Francois Steux Mentor: Installateur: Delcom BV
ID-label: B.T.W. nr.: BE 0740 887 582 Klantreferentie:
Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serienummer: 19370786

Datum verslag: 17/07/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Noord-Gistelhof
Huisnummer 6
Busnummer
Postcode 8000
Gemeente BRUGGE
Land België

Eigenaar

Naam Niet gekend
Straatnaam Noord-Gistelhof
Huisnummer 6
Busnummer
Postcode 8000
Gemeente BRUGGE
Land België

Installateur

Naam Delcom BV
BTW nr. BE 0740 887 582
Telefoonnummer 0474/75.00.19
E-mail davy@delcom.be

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: : 1SAG3200319790

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3-230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 17


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 239 MΩ

RE: 3,81 Ω

OK

OK

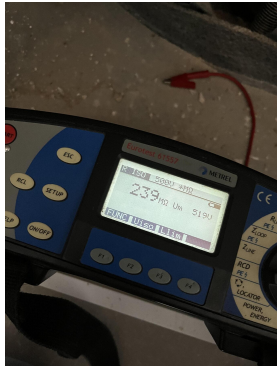

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	17	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 17/7/2050



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.



Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:00 tot 08:36

De inspecteur Jean Francois Steux


Jean-Francois Steux

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 17/7/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.










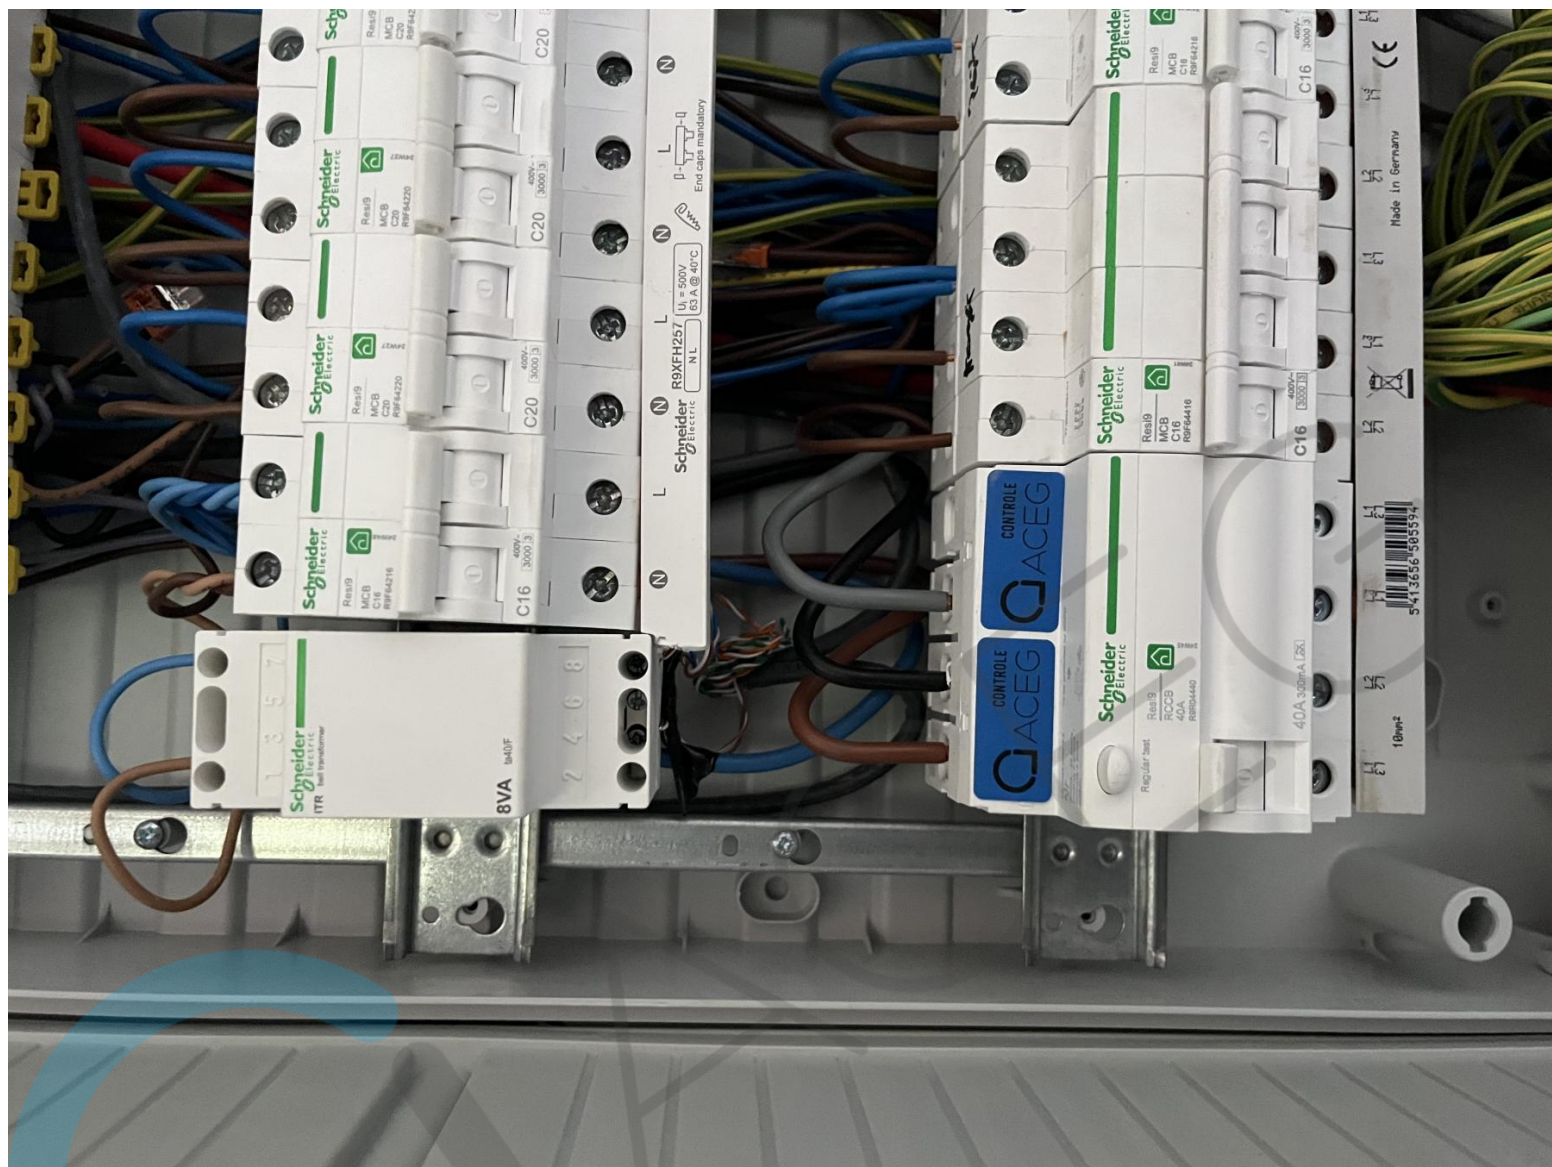



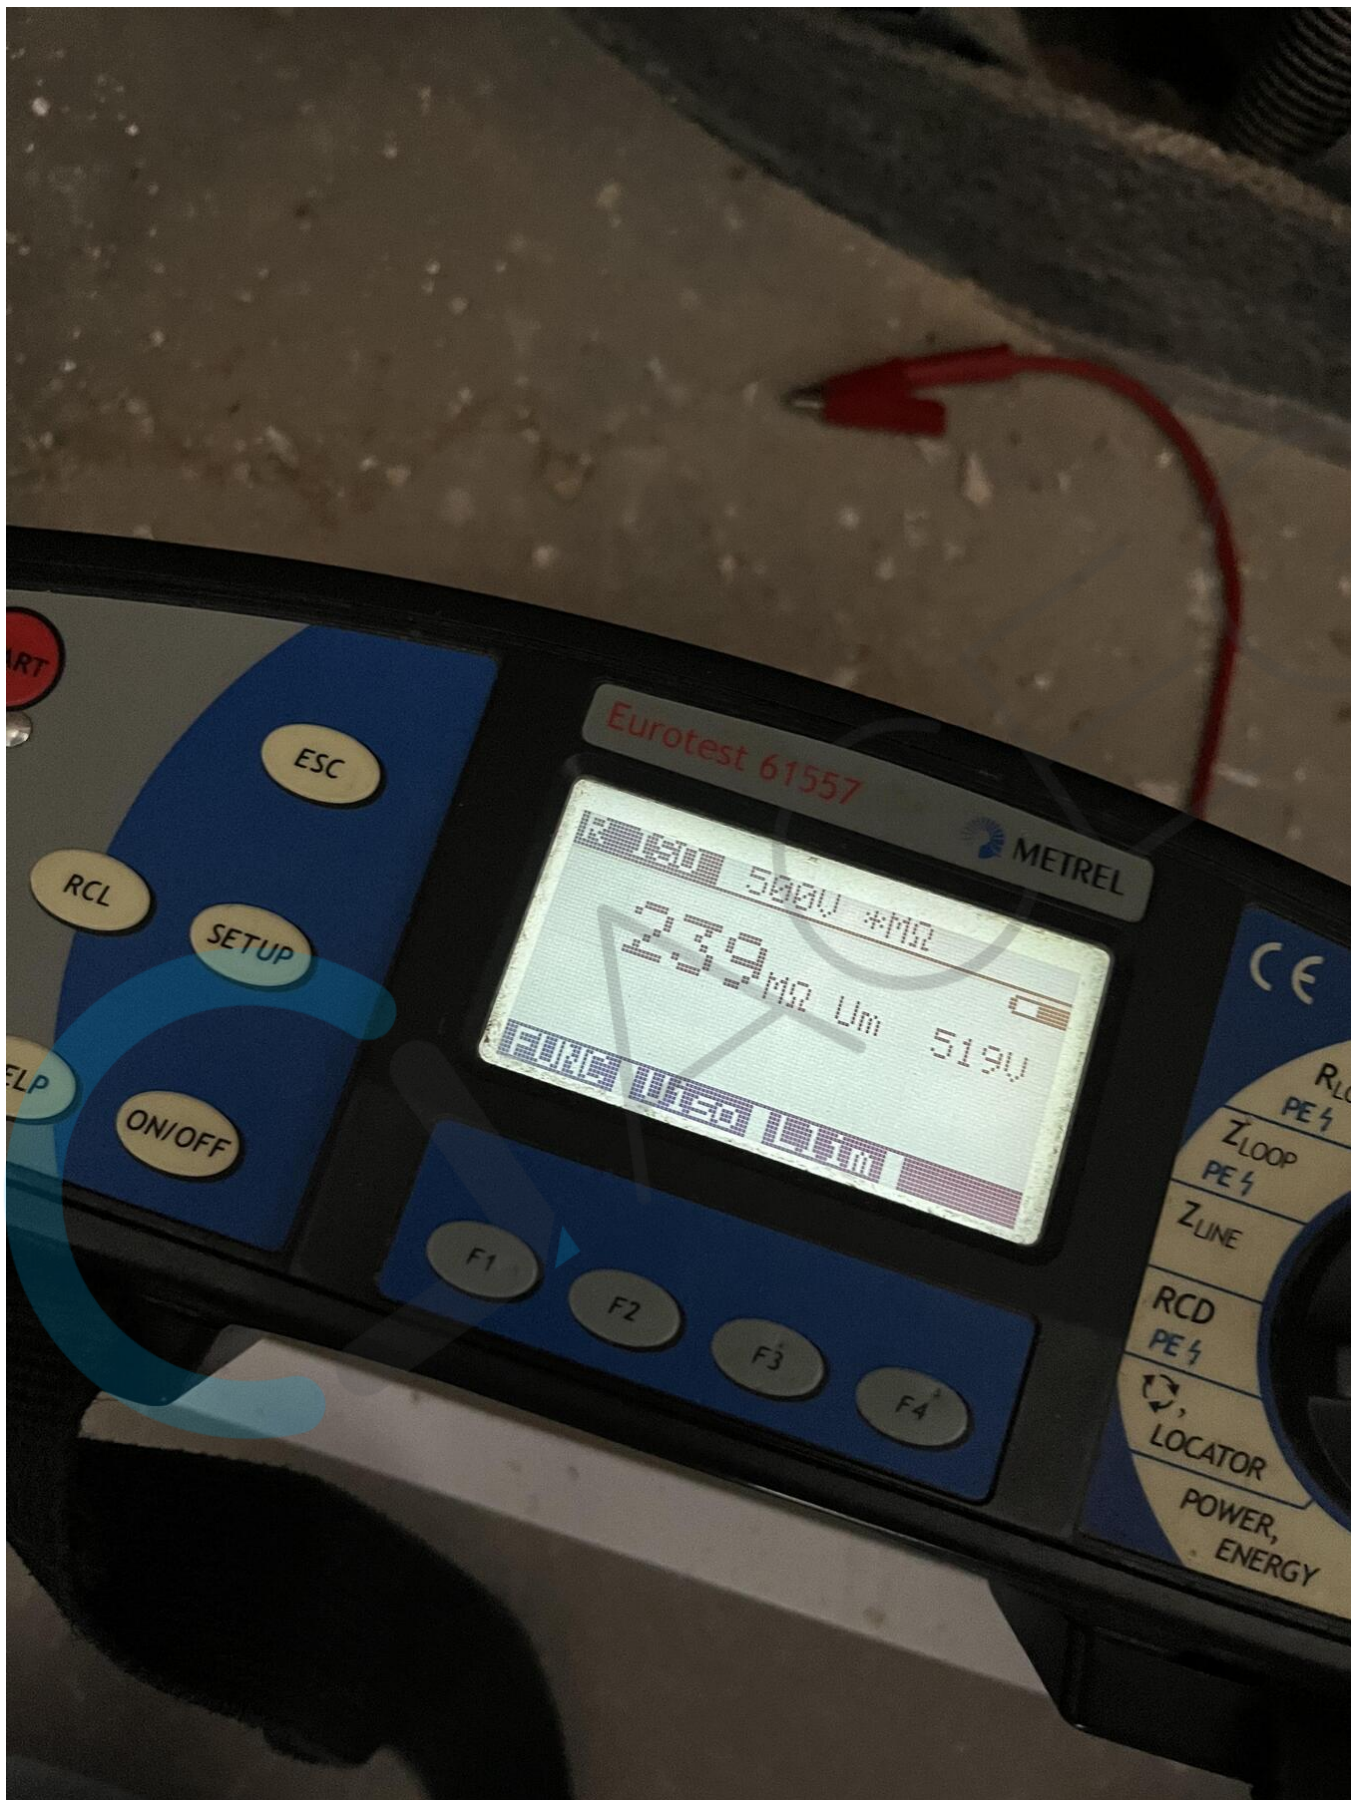

Elektrisch Schema

Project: Noord-Gistelhof 6 Brugge

Firma: Delcom BV
Ratelingestraat 22
8750 Wingene

Klant: Bouwerken Vandorpe
Industriestraat 20
8755 Ruislede

Schakelkasten : 1
Voeding: 3x230V
Toevoer: EXVB 4x10

 Elektricit�t - Computers - Multimedia	
Ruddervoorde - Wingene 0474 75 00 19	
Created	Approved
Document type	Document status
Title, supplementary title Voortblad	Date of issue 14/07/2025
	Rev. Lang. Sheet 1/4

Jean-Francois Steux

300mA

A: 20A Kookplaat
B: 20A Stopc. Zekkast
C: 20A CV
D: 20A Oven
E: 20A Zonnepanelen

Diff 1 30mA/2P


F: 16A Verl.gelijkvloers
G:20A Stopc. badkamer
H:20A Stopc. Slaapkamer ouders
I:20A Wasmachine
J:20A Droogkast
K: 20A Stopc. Berging

Diff 2 30mA/2P

L: 16A Verl.verdiep
M: 20A Stopc. 2x Slaapkamer
N: 20A Handdoekradiator
O: 20A Stopc. keuken WB
P: 20A Stopc. Living
Q: 20A Vaatwas

 Ruddervoorde - Wingene 0474 75 00 19		Created		Approved	
Document type		Document status		Rev.	
Title, supplementary title Kringverdeling		Date of issue 14/07/2025		Lang. Sheet 2/4	

Jean-Francois Steux

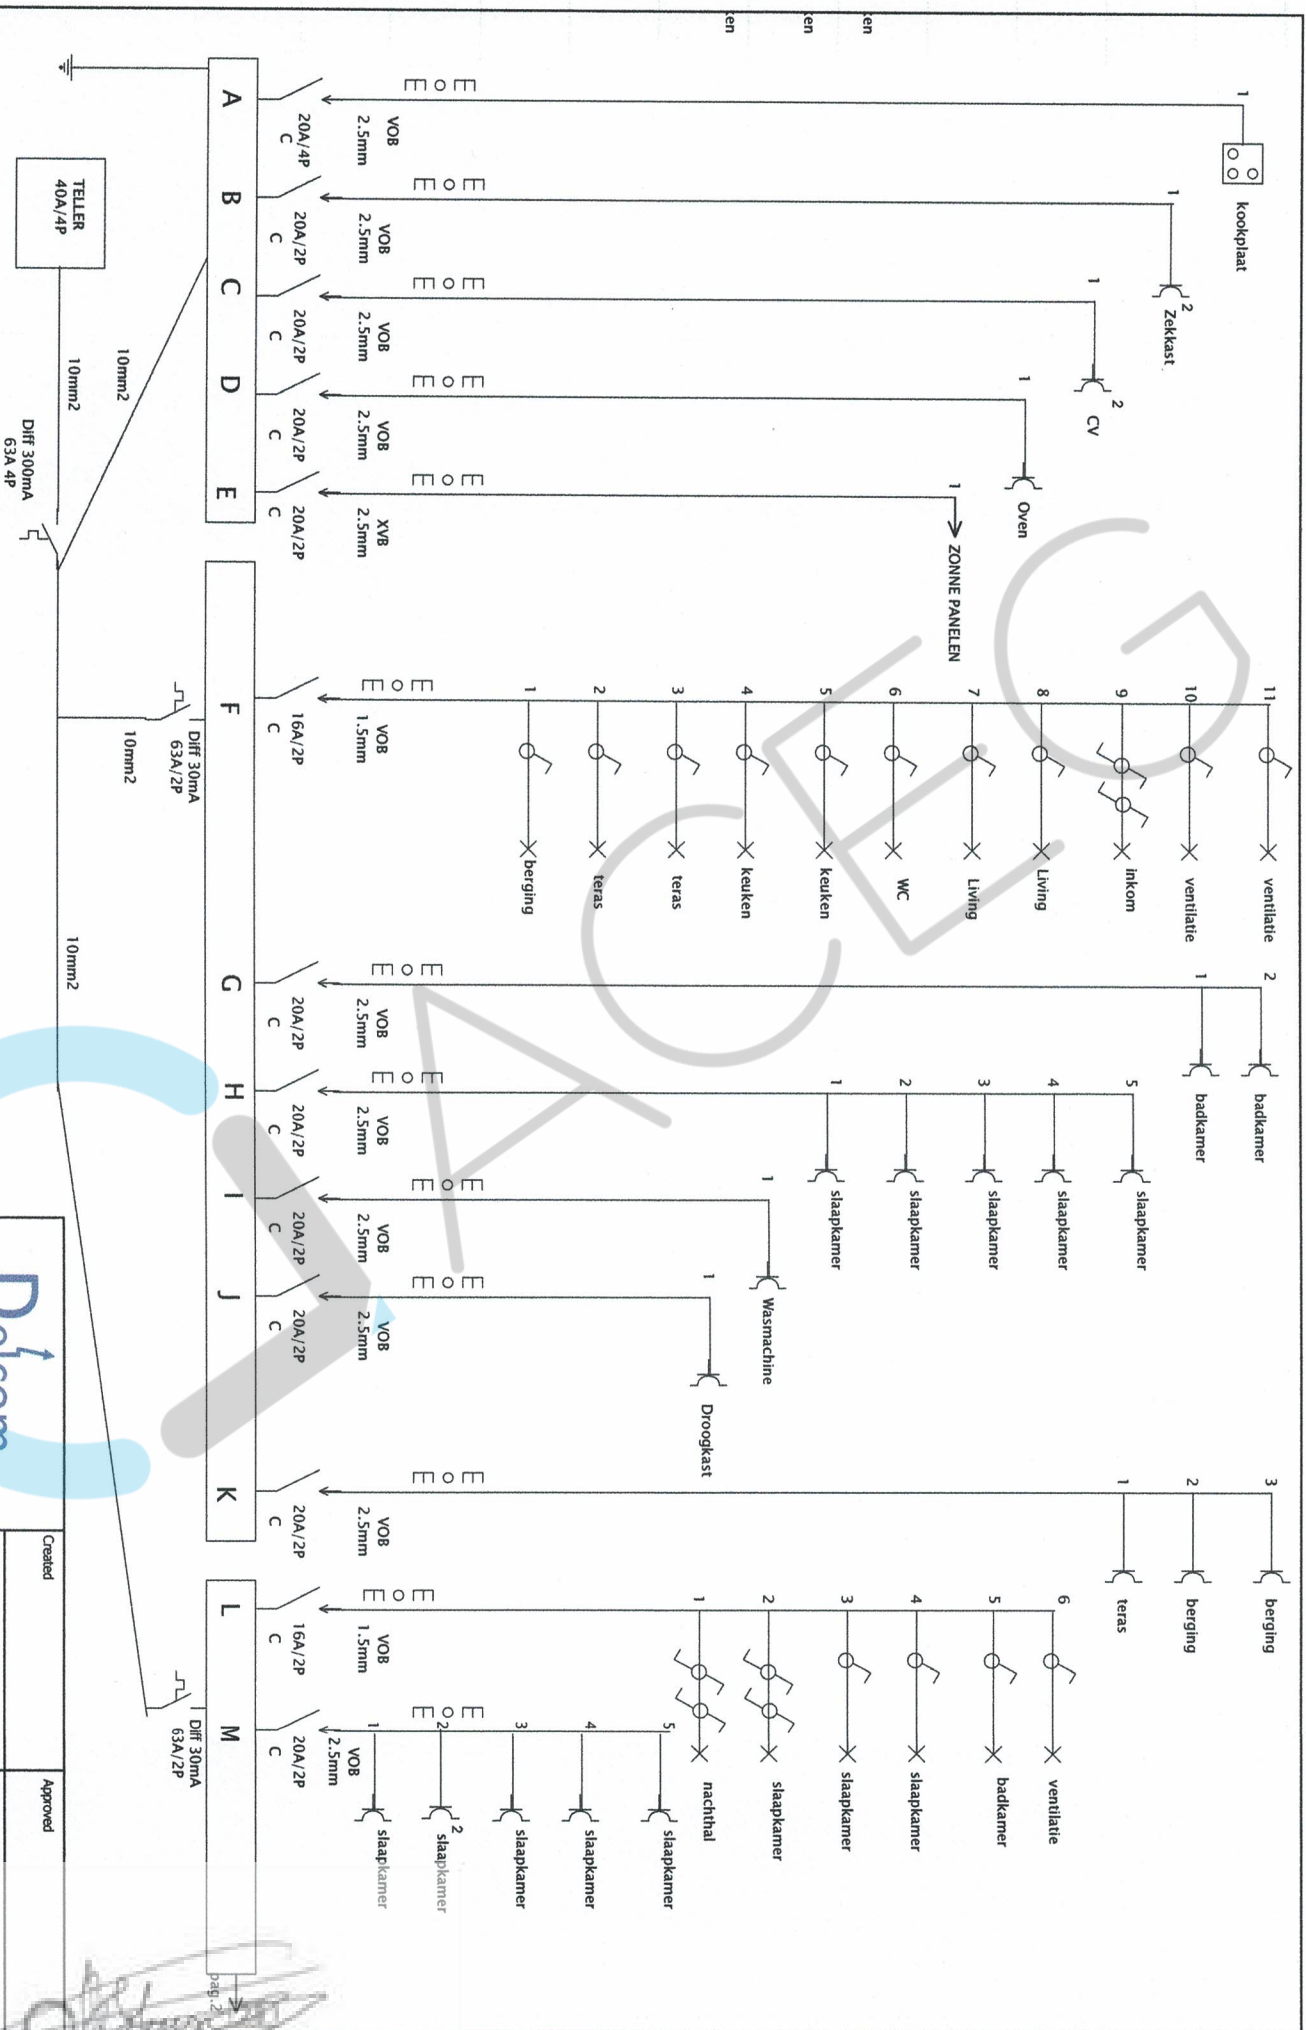


N
O

Delcom
Elektronisch - Computers - Multimedia

Ruddervoorde - Wingene
0474 75 00 19


Created	Approved
Document type	Document status
Title, supplementary title eentradschema	
Date of issue	Rev.
14/07/2025	Lang.
	Sheet
	3/5


Jean-François Steux

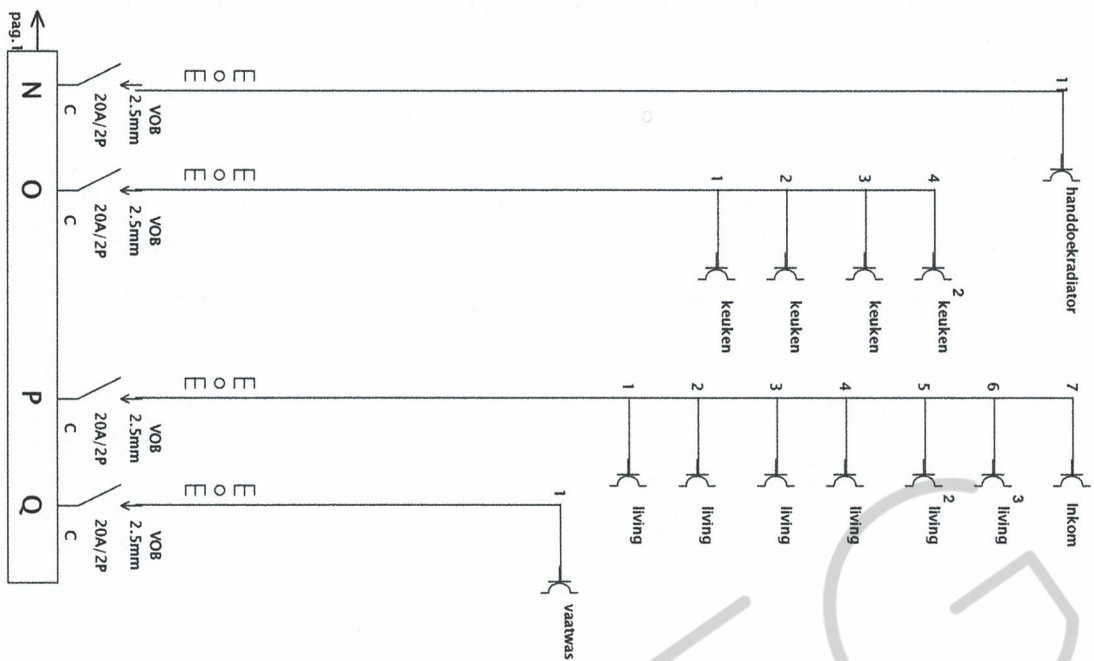

 Registrasie - Computers - Netwerke		Created		Approved	
Rudderwoorde - Wingene 0474 75 00 19		Document type		Document status	
Title, supplementary title		Date of issue		Rev.	
14/07/2025		14/07/2025		Sheet	
4/5		4/5		4/5	

Jean-Francois Steux

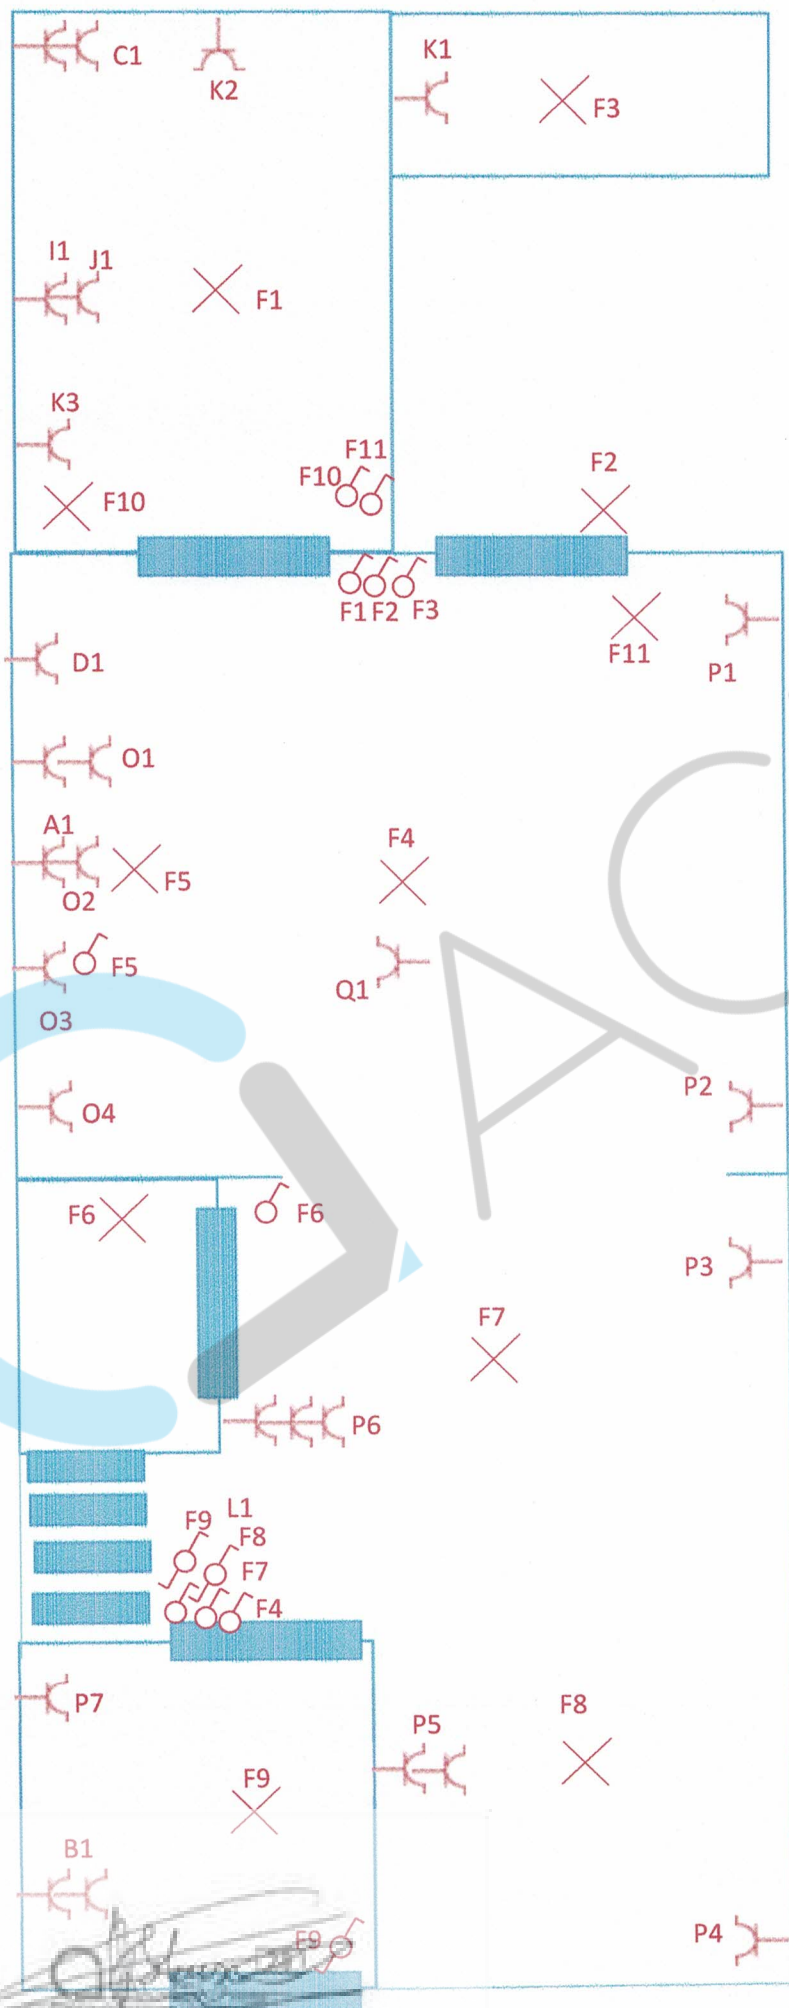

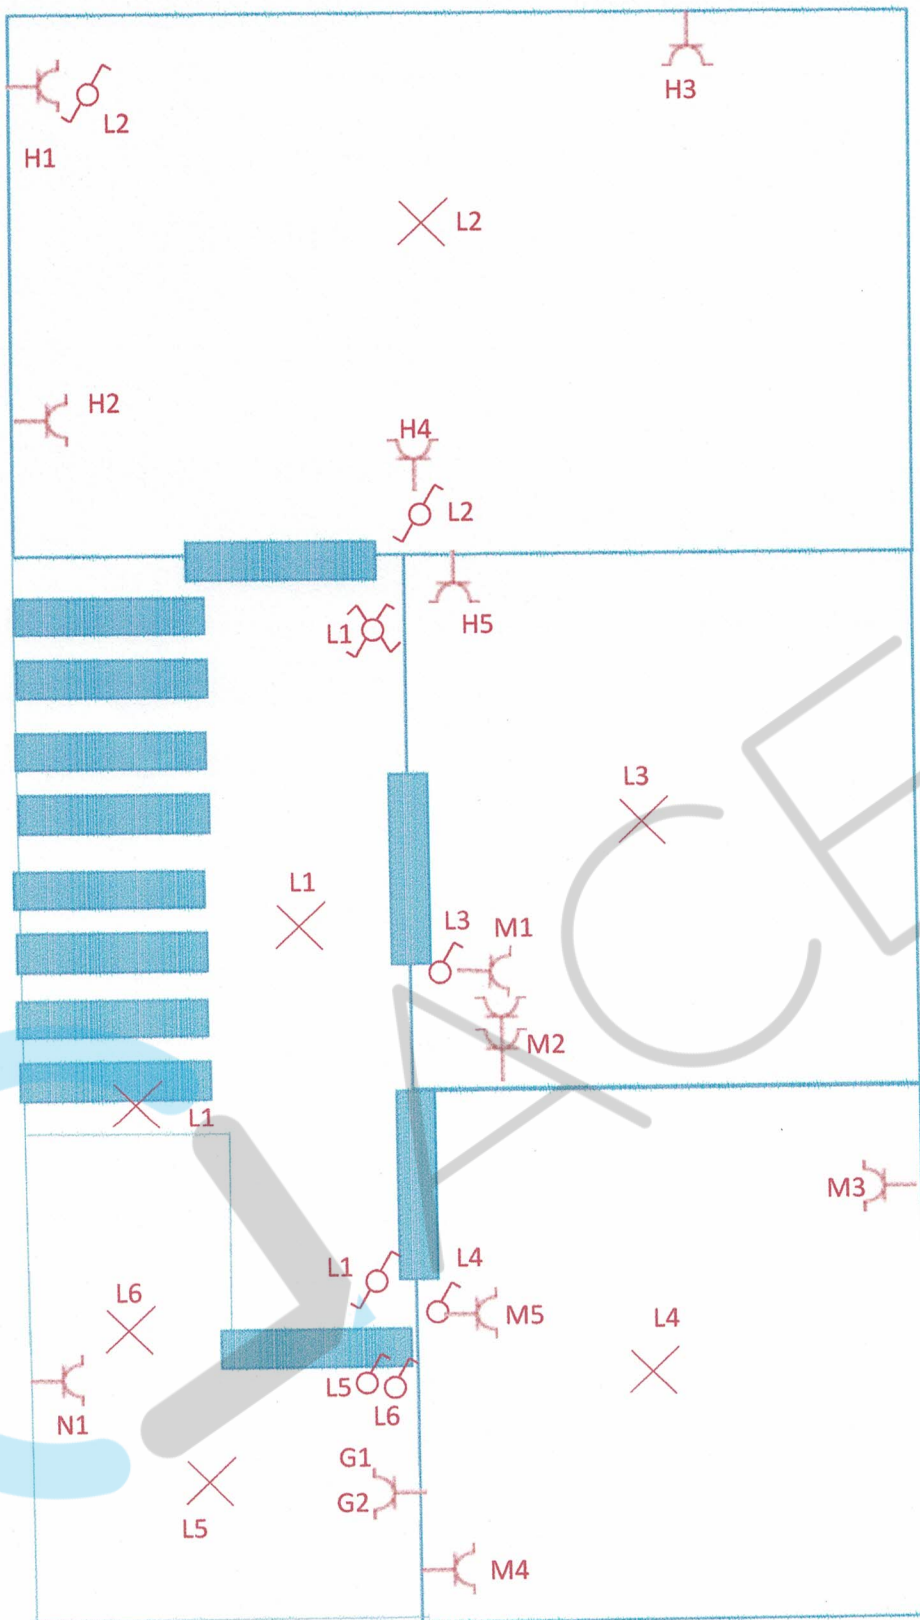


 Jean-François Steux
